

經濟水道委員會

說明資料

令和3年3月2日
觀光文化交流局

目 次


	頁
1 国際展示場拡張整備に係る基本計画の策定……………	1
2 天守閣木造復元の実施設計……………	3
3 現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項への対応状況……………	4

1 国際展示場拡張整備に係る基本計画の策定

(1) 交通処理上の主な課題

- ・国際展示場駐車場の入庫待ち車両による車列
- ・催事の搬出入車両の路上待機
- ・名港中央ICにおける交通集中（大規模催事の来場時・退場時）

(2) 交通処理上の主な課題の位置図

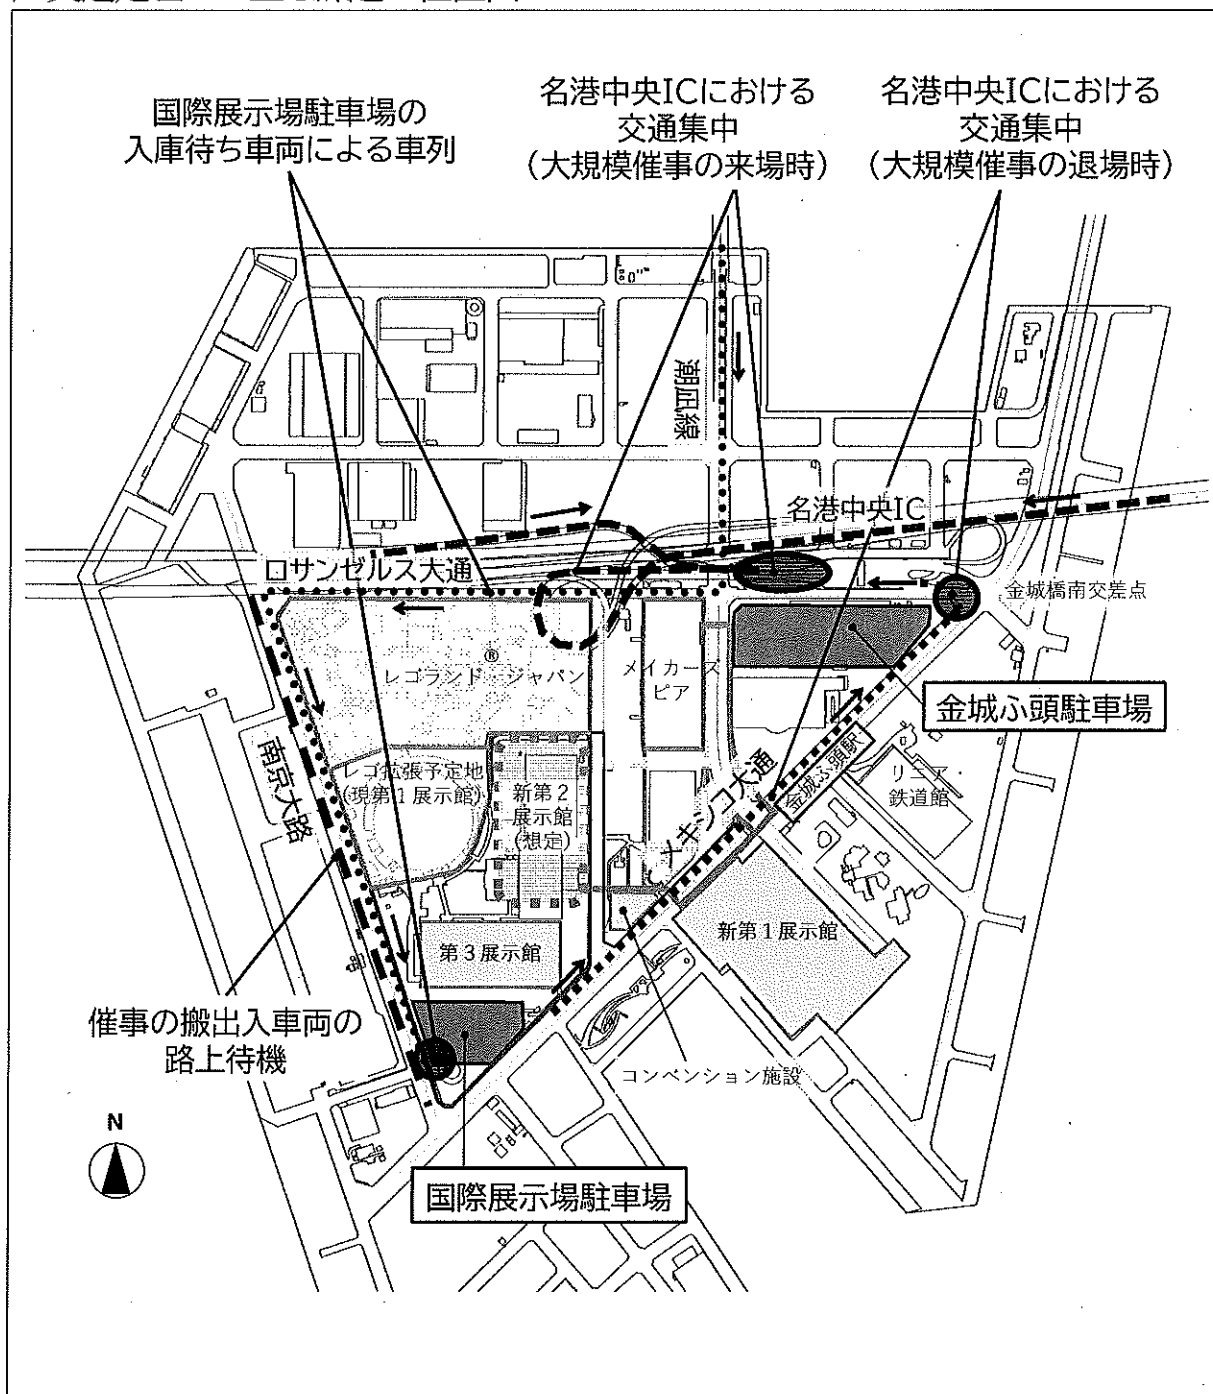

(3) 想定スケジュール

区分	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度～		
新第1 展示館	建設		20,000 m ²						
	●10月供用開始								
新第2 展示館	当初案	基本計画					事業者選定 → 設計・解体・建設		27,000 m ²
	見直し案	交通対策検討	基本計画					事業者選定 → 設計・解体・建設	
第3 展示館	13,500 m ²								
備考	●アジア競技大会の開催								

2 天守閣木造復元の実施設計

(単位：千円)

区分	設計業務		調査業務	
	内容	金額	内容	金額
実施 予定	・設計図作成	5,000	・史実調査 ・石垣調査	19,000
繰越 予定	—	—	・地盤調査	61,000
未実施 見込み	・設計図作成 ・現状変更許可書類作成 ・施工技術検討業務	4,000	—	—

3 現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項への対応状況

(1) 現天守の解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判断するための調査・検討について

指摘事項	内 容	調査実施状況
ア 内堀の地下遺構の把握、御深井丸側内堀石垣の状況及び安定性を確認するための追加発掘調査		
内堀底面の調査	内堀内（堀底及び石垣根石）の発掘調査	終了
	・地中レーダー探査等に基づく内堀底面遺構の発掘調査（追加） ・小天守西側堀底の地中レーダー探査（追加）	・発掘調査は概ね終了 ・地中レーダー探査は終了
御深井丸側内堀石垣の現状把握	内堀内（堀底及び石垣根石）の発掘調査	終了
イ 御深井丸等の地下遺構把握のための発掘調査		
御深井丸等発掘調査	御深井丸等の仮設構台、栈橋設置地点の地下遺構把握のための発掘調査	概ね終了
ウ 大天守台北面石垣の孕み出しについての調査・検討		
孕み出し部分の裾部の発掘調査	孕み出し部分裾部の石垣及び地盤の状況を把握するための発掘調査	終了
エ 天守台石垣背面等の空隙についての調査		
天守台の石垣背面等空隙調査	大天守台北面石垣の孕み出し部分におけるより精度を上げた調査（レーダー探査）	終了
天守台以外の石垣背面等空隙調査	天守台周辺石垣の外観総合調査を再検討し、空隙調査等の追加の必要性を検討	外観総合調査票（石垣カルテ）の再整理は概ね終了

注 上記考古学的調査結果を踏まえた工学的な視点からの検討を行い、現天守の解体・仮設物設置の妥当性について、令和2年度内に有識者会議に諮り了承を得る予定

(2) 現状変更を必要とする理由について

指摘事項	内 容	実施状況
現天守解体理由の整理	現天守解体の理由が耐震対策のみか、木造天守復元のためかの検討、整理	木造天守復元の具体的計画を「本丸整備基本構想」の中で整理し有識者会議で概ね了承
木造天守復元に係る計画	木造天守復元に係る計画の具体的内容の追加提出	
