

総務環境委員会資料

令和元年12月2日

南陽工場設備更新事業の進捗状況について

目 次

1 事業概要	1
2 進捗状況等	3


環 境 局

1 事業概要


(1) 設備更新の内容

事 項	設備更新前（現在）	設備更新後
設備規模	(焼却設備) 1,500トン/日	(焼却設備) 560トン/日 (破碎設備) 100トン/日
建 屋	工場棟 管理棟	工場棟 (既存) 管理棟 (既存) 破碎棟 (新築)

(2) 設備更新工事のイメージ

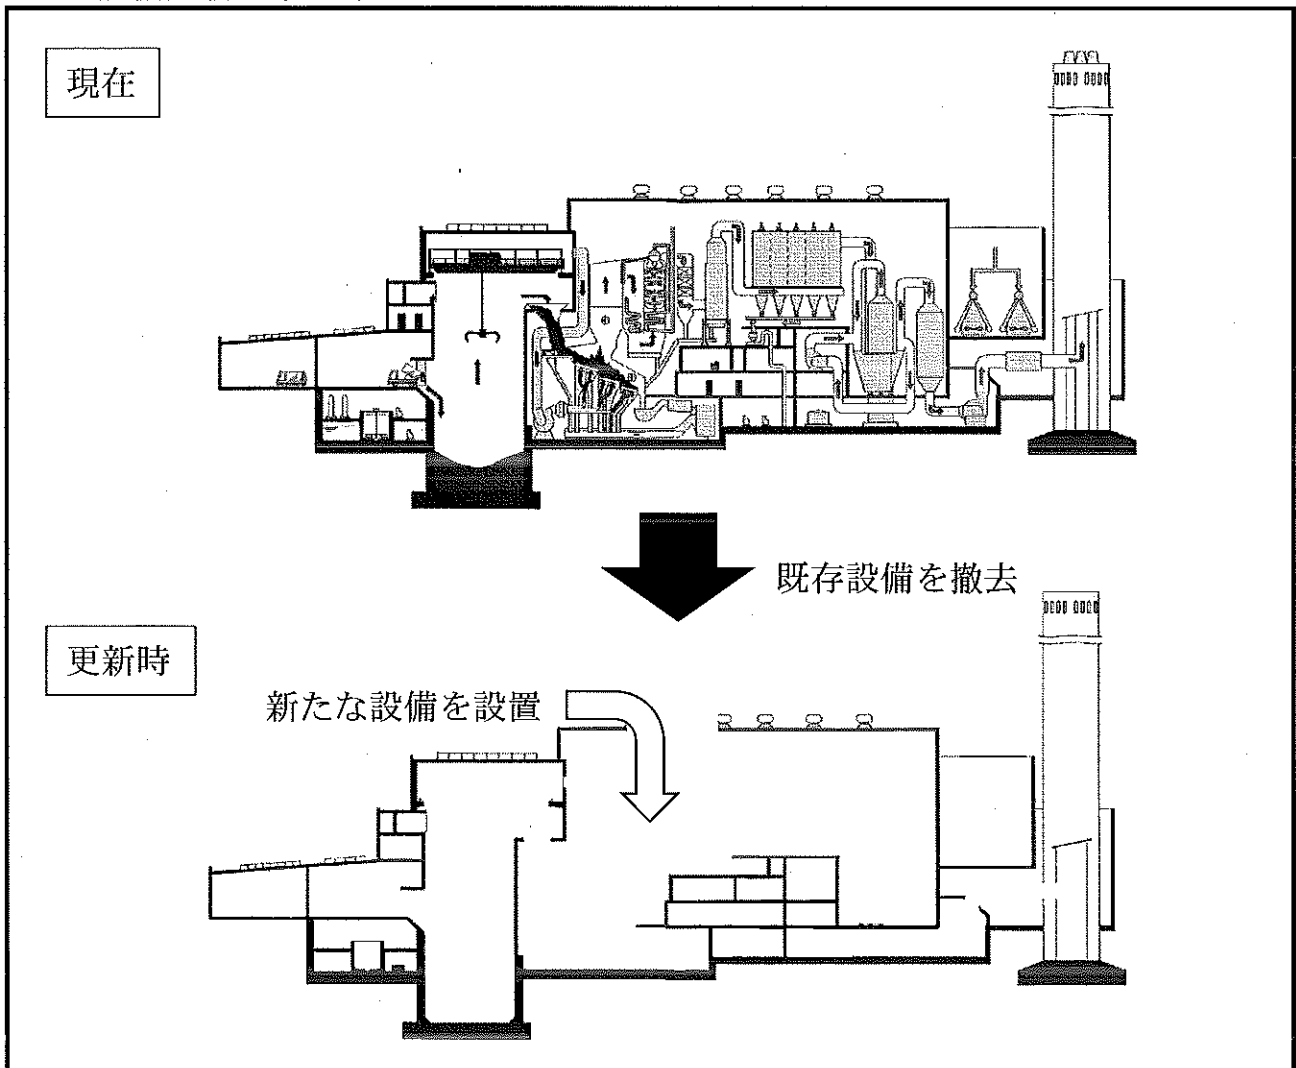

(3) 設備更新後の配置図

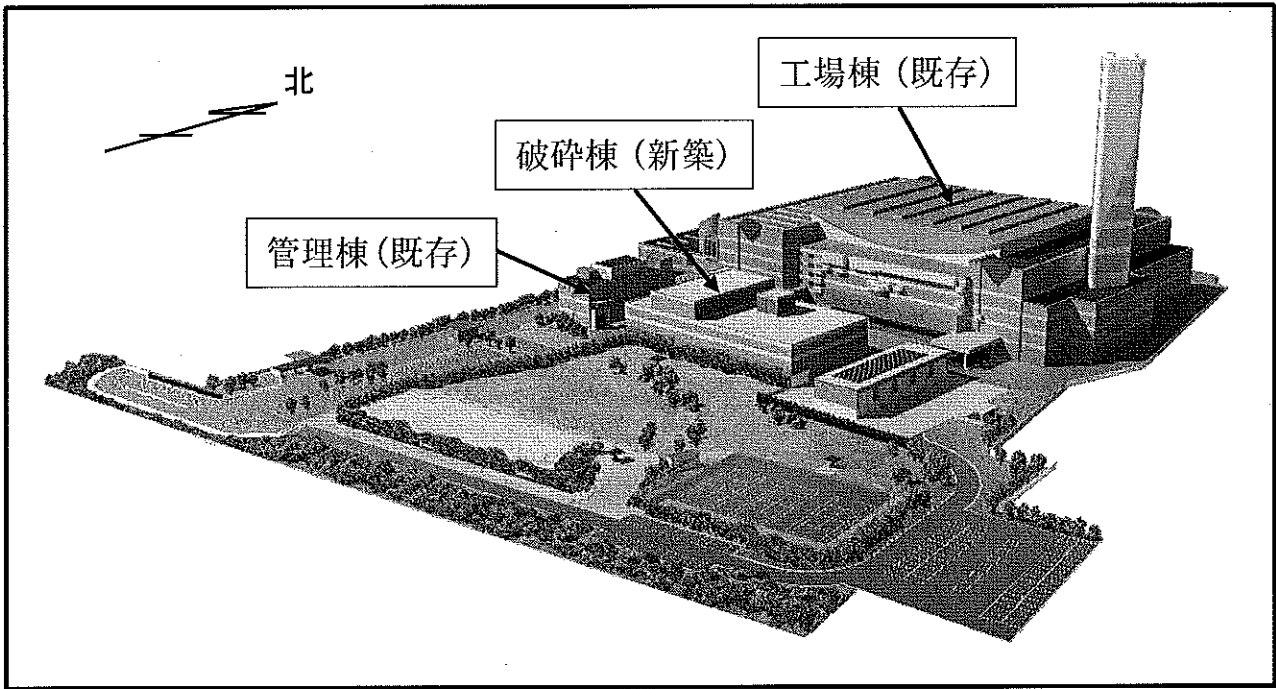

(4) スケジュール

年 度	元	2	3	4	5	6	7	8
現工場の稼働								
設備解体工事								
設備更新工事				設計				稼働

2 進捗状況等

(1) 現在の進捗状況

年 月	事 項	内 容
令和元年8月	設備解体工事	実施設計着手
	設備更新工事	発注仕様書作成着手
令和元年11月～	環境影響評価 (準備書)	告示・縦覧 市民意見の受付 説明会の開催

(2) 今後の予定

年 月	事 項	内 容
令和2年度	環境影響評価 (評価書)	告示・縦覧
	設備解体工事	入札手続き 〔総合評価落札方式〕
令和3年度	設備更新工事	入札手続き 〔総合評価落札方式 (高度技術提案型)〕
